


# I 期工事工程 (新入院棟新築他) 延べ42か月

## 明石会館他解体工事、山留・掘削工事

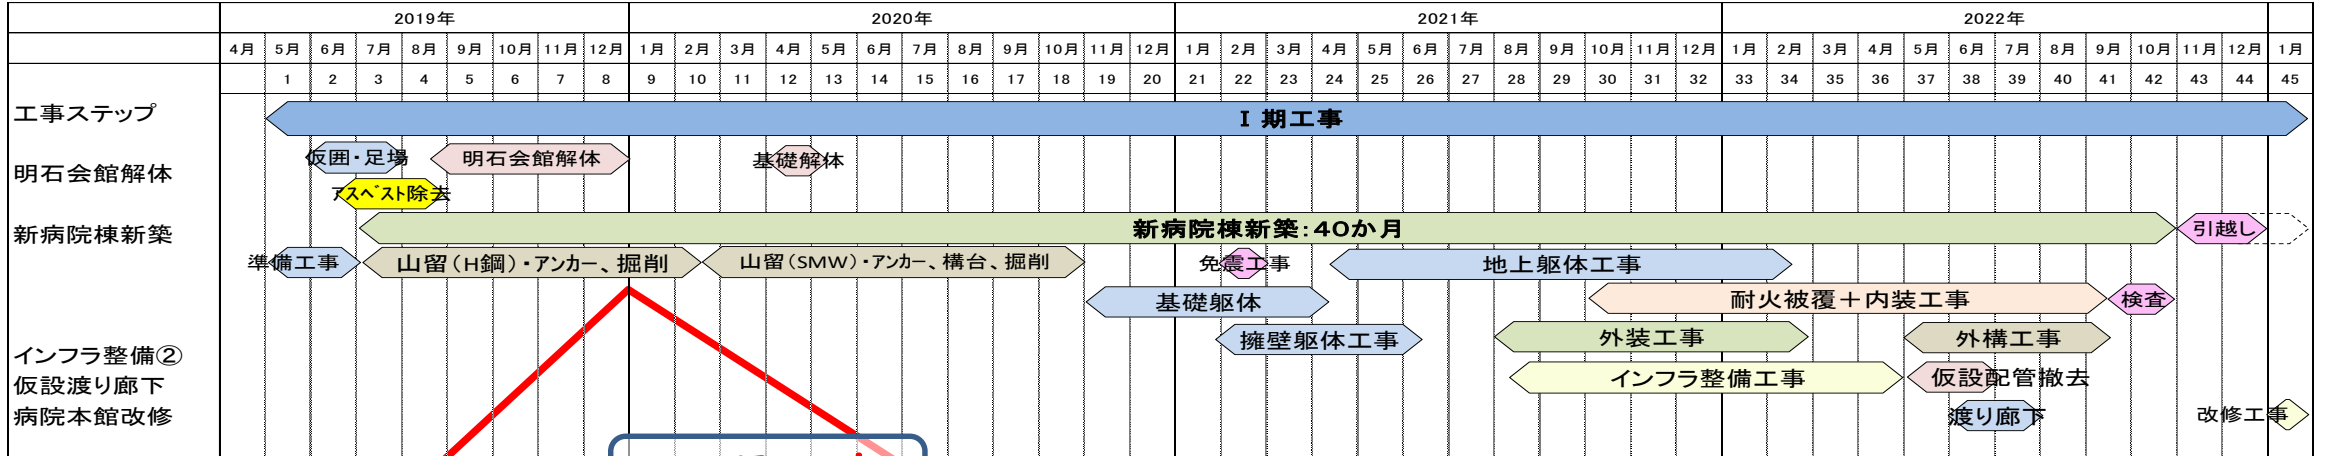


11月工事


▼ 第1回説明会

▼ 第2回説明会予定

第3回説明会予定 ▼

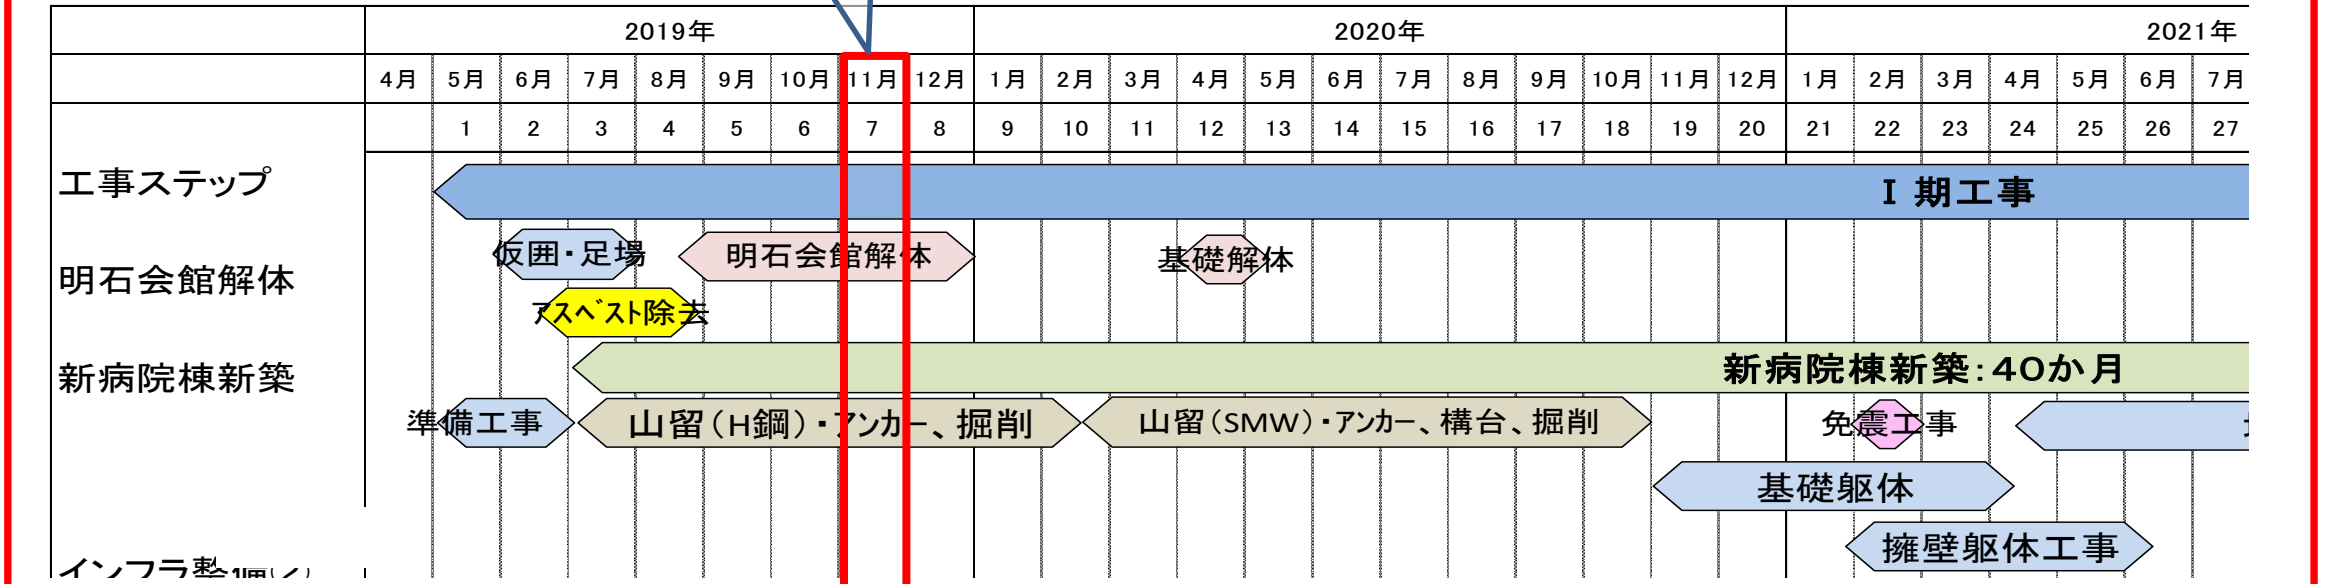

# 【明石会館・解体工事】

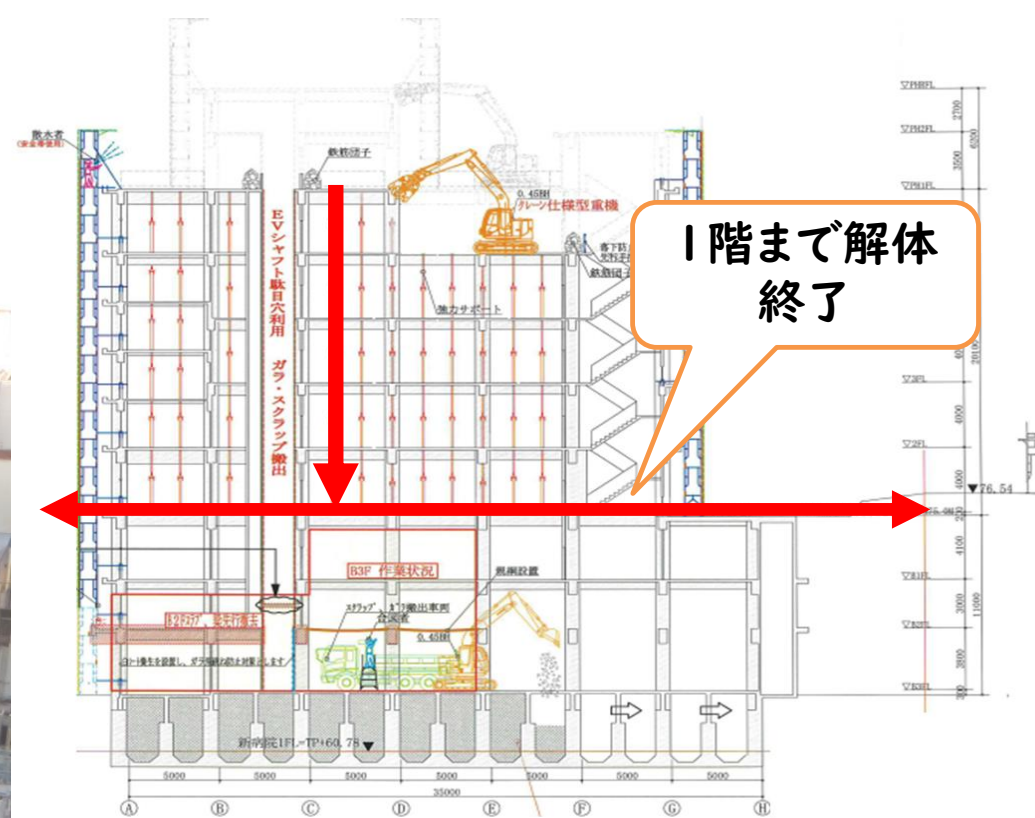

\*低騒音・振動・粉塵工法の採用、3台の解体重機で下から、散水を行いながら解体。


\*明石会館の解体は順調に1階まで進んでいる



# 【テニスコート跡地掘削工事】



## 山留・掘削工事計画 断面図

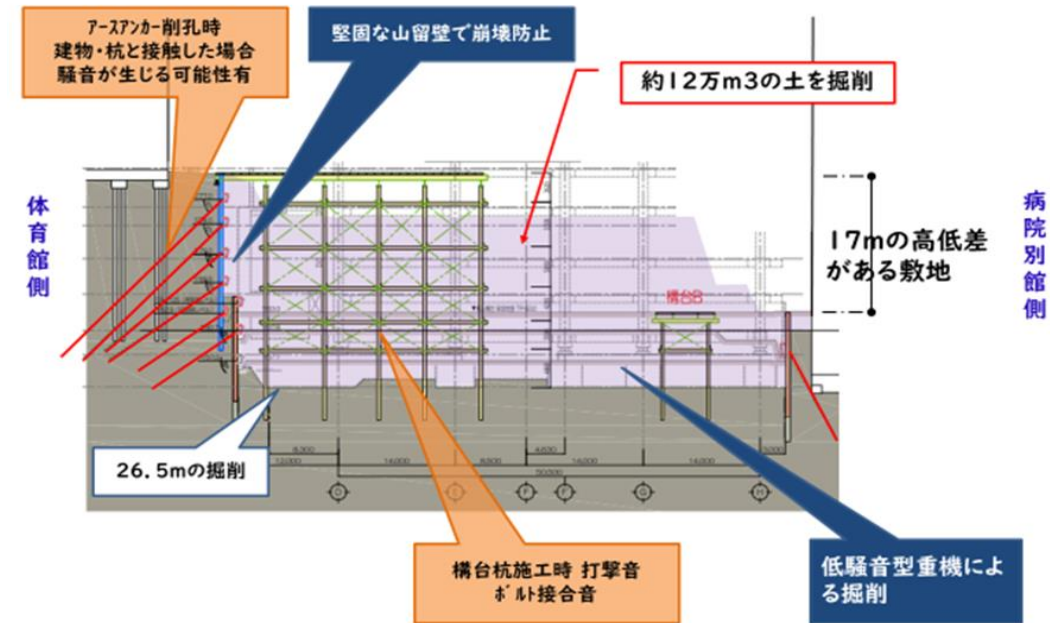

\*これから先26.5mの掘削を行い、  
12万m<sup>3</sup>(リュベ)の土を排出するため、  
約1年余りは掘削を行うことになる。  
\*掘削した土は、山梨県富士ヶ嶺・八王子市・  
青梅市の処分場に排出される。

\*現在掘削は、およそ病院別館2階  
レベルまで進んでいる。

2019/11/21 15:18



# 【煙突・解体工事】



\*煙突の解体は上から約15m  
(約1/3)まで解体されている。

\*円筒上の煙突を、1~2m角程  
度に切り分けて、クレーンで吊  
って降ろす作業中の、繰り返し  
を行っている。
